

**Asistentes**

**Canónigo Obrero**  
D. Pedro Soldado





**Arquitectos**  
Gabriel Ruiz Cabrero  
Gabriel Rebollo  
Francisco Rebollo

**Arqueólogo**  
Raimundo Ortiz

**Jefe de Mantenimiento**  
Miguel Espejo

**Aparejadores**  
Jesús Mateo

**Restauradora**  
Anabel Barrena

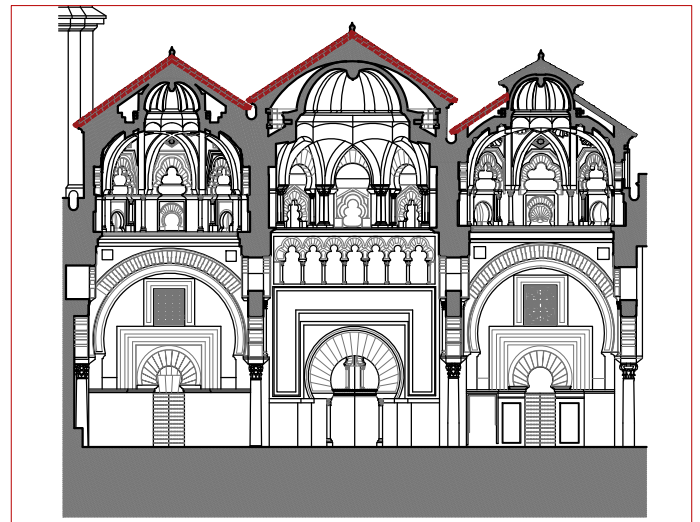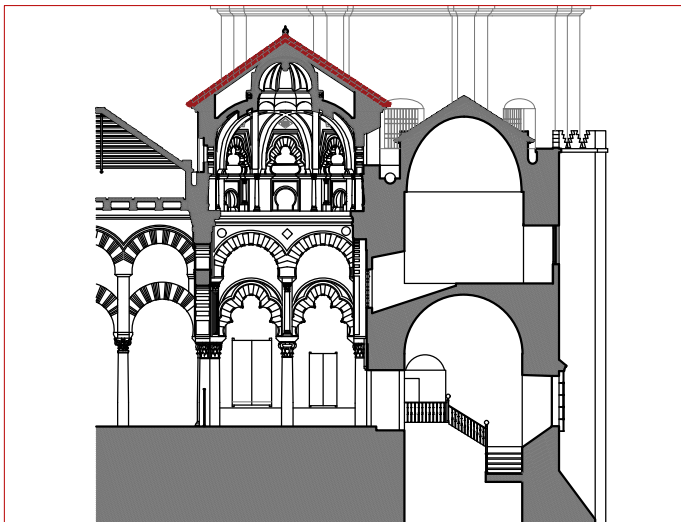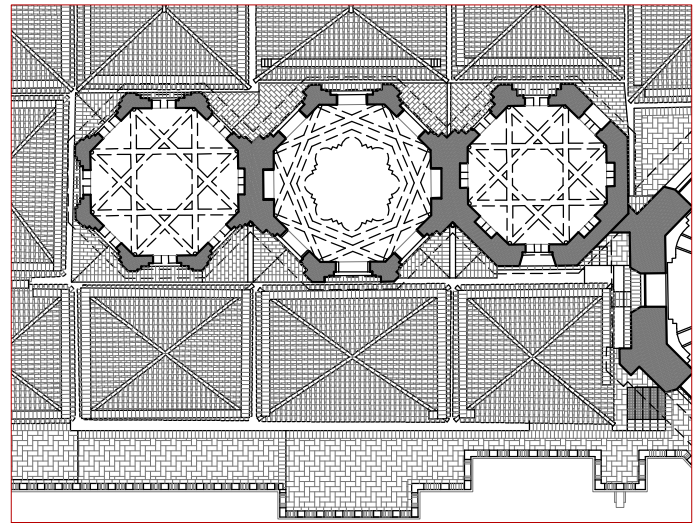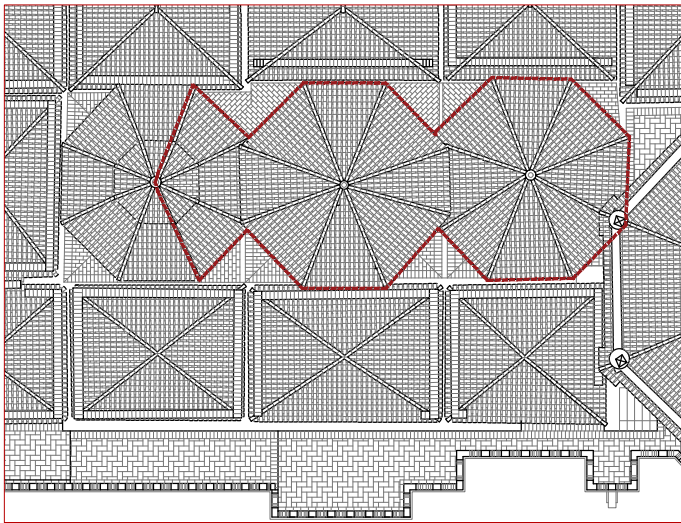

**Observaciones**

**Quinta vista**

Se han cumplido las órdenes dadas en la anterior visita. El tratamiento antixilófagos ha sido aplicado conforme a la técnica utilizada habitualmente en el edificio. Se establece que antes de cerrar los espacios que quedan entre las cubiertas y las cúpulas se aplicará nuevamente el tratamiento. Se decide proponer a la empresa que suministra los productos de desinfección una visita a la obra para estudiar si el sistema de tratamiento final debiera ser diferente.

### Observaciones

Levantada la cubierta del faldón oriental de la cúpula occidental en una pequeña superficie, se observa que la técnica de formación de pendientes es semejante a las anteriores. Se ordena el levantamiento de todo el faldón y el descubrimiento de la superficie de conexión entre ambas cúpulas, tanto entre estas dos como entre la oriental y la central, según estaba previsto en el Proyecto. Se está realizando seguimiento arqueológico de todo el proceso, que queda rigurosamente documentado. Par proseguir con esta investigación sobre la conexión entre las cúpulas se ordena desmontar las protecciones de madera en las cuatro esquinas para poder ver y estudiar los tramos de encuentro, pero conservándose las protecciones en los frentes norte y sur así como en los dos tercios exteriores, en previsión de posibles lluvias.

